



DESARROLLO DE ACTIVIDADES

INICIO:04/12/00

TERMINÓ:10/12/00

TERMINACION:POZO AEA-499

Montó equipo.Realizó perfil de cemento y neutrón.Punzó las zonas:

1888/92-1835/38-1464/68-1455/58-1372.5/75.

Realizó los siguientes ensayos:

1888/92: 2400lt/h-1150m-32%-Sal 9.3-Ph 8

1835/38: 2400lt/h-1170m-100%-Sal 5.8-Ph 8

1464/68-1455/58: 320 lt/h-1342m- 100% +RPo-Sal :14.54- PH8

1372.5/75: 320 lt/h-1248m- 34%-Sal 15.12- Ph 8 +4 m de relleno sobre TPN.

Cementó la zona 1835/38. Rotó cemento y ensayó hermeticidad con resultado positivo

Bajó instalación de producción. Desmontó equipo.



POZO :AEA-499

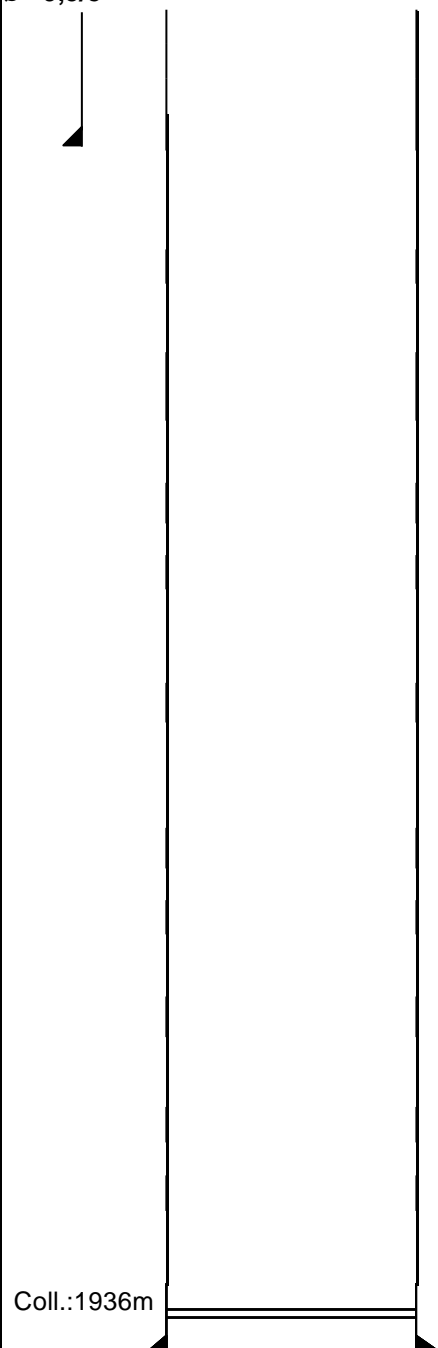
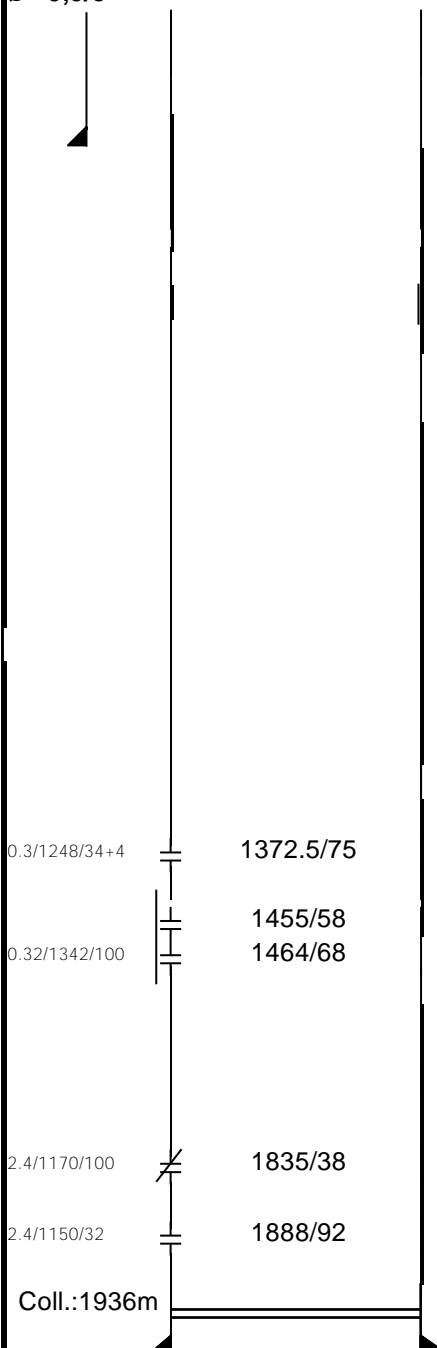
ESQUEMA DE TERMINACION

INICIO:04/12/00

TERMINÓ:10/12/00

ESTADO ANTERIOR : ENTUBADO

ESTADO FINAL : PROD. DE PETROLEO

PREVIO A LA INTERVENCION		DESPUES DE INTERVENIDO	
DIAMETRO CAÑERIA Y TAPONES	PROFUNDIDAD (MTS.)	DIAMETRO CAÑERIA Y TAPONES	PROFUNDIDAD (MTS.)
$\varnothing= 9,5/8"$ $\varnothing= 5,1/2"$		$\varnothing= 9,5/8"$ $\varnothing= 5,1/2"$	
			
Coll.:1936m		Coll.:1936m	
Zto:1943m		Zto:1943m	
